Kreisverkehr Hamburger Straße / Mühlenweg in Trittau

Konzept M+O
22.05.2012

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Planung**	**10 Tage**	**Mo 21.05.12**	**Mo 04.06.12**
2	Ausführung Straßenbau	10 Tage	Mo 21.05.12	Mo 04.06.12
3				
4	**Ausschreibung**	**53 Tage**	**Di 29.05.12**	**Do 09.08.12**
5	Leistungsverzeichnis erstellen	10 Tage	Di 29.05.12	Mo 11.06.12
6	Vorankündigung der Ausschreibung	0 Tage	Di 05.06.12	Di 05.06.12
7	LV prüfen	5 Tage	Di 12.06.12	Mo 18.06.12
8	LV Freigabe	0 Tage	Mo 18.06.12	Mo 18.06.12
9	LV Verschickung	2 Tage	Di 19.06.12	Mi 20.06.12
10	Kalkulationszeitraum	15 Tage	Do 21.06.12	Mi 11.07.12
11	Submission	0 Tage	Mi 11.07.12	Mi 11.07.12
12	Zuschlagsfrist max. 30 Kalendertage	21 Tage	Do 12.07.12	Do 09.08.12
13	Angebotsprüfung	5 Tage	Do 12.07.12	Mi 18.07.12
14	Auftragsprüfung und Vergabe	15 Tage	Do 19.07.12	Mi 08.08.12
15	Auftrag	0 Tage	Mi 08.08.12	Mi 08.08.12
16				
17	**Ausführung**	**50 Tage**	**Mi 15.08.12**	**Do 25.10.12**
18	Baubeginn	0 Tage	Mi 15.08.12	Mi 15.08.12
19	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Do 16.08.12	Mi 22.08.12
20	Ausführung	45 Tage	Do 23.08.12	Do 25.10.12
21	Bauende	0 Tage	Do 25.10.12	Do 25.10.12
22				
23	**Ausschüsse**	**125 Tage**	**Do 14.06.12**	**Do 06.12.12**
24	Bau- und Umwelt	1 Tag	Do 14.06.12	Do 14.06.12
25	Bau- und Umwelt	1 Tag	Do 16.08.12	Do 16.08.12
26	Bau- und Umwelt	1 Tag	Do 13.09.12	Do 13.09.12
27	Bau- und Umwelt	1 Tag	Do 01.11.12	Do 01.11.12
28	Bau- und Umwelt	1 Tag	Do 15.11.12	Do 15.11.12
29	Gemeinde Vertretung	1 Tag	Do 21.06.12	Do 21.06.12
30	Gemeinde Vertretung	1 Tag	Do 30.08.12	Do 30.08.12
31	Gemeinde Vertretung	1 Tag	Do 27.09.12	Do 27.09.12
32	Gemeinde Vertretung	1 Tag	Do 22.11.12	Do 22.11.12
33	Gemeinde Vertretung	1 Tag	Do 06.12.12	Do 06.12.12

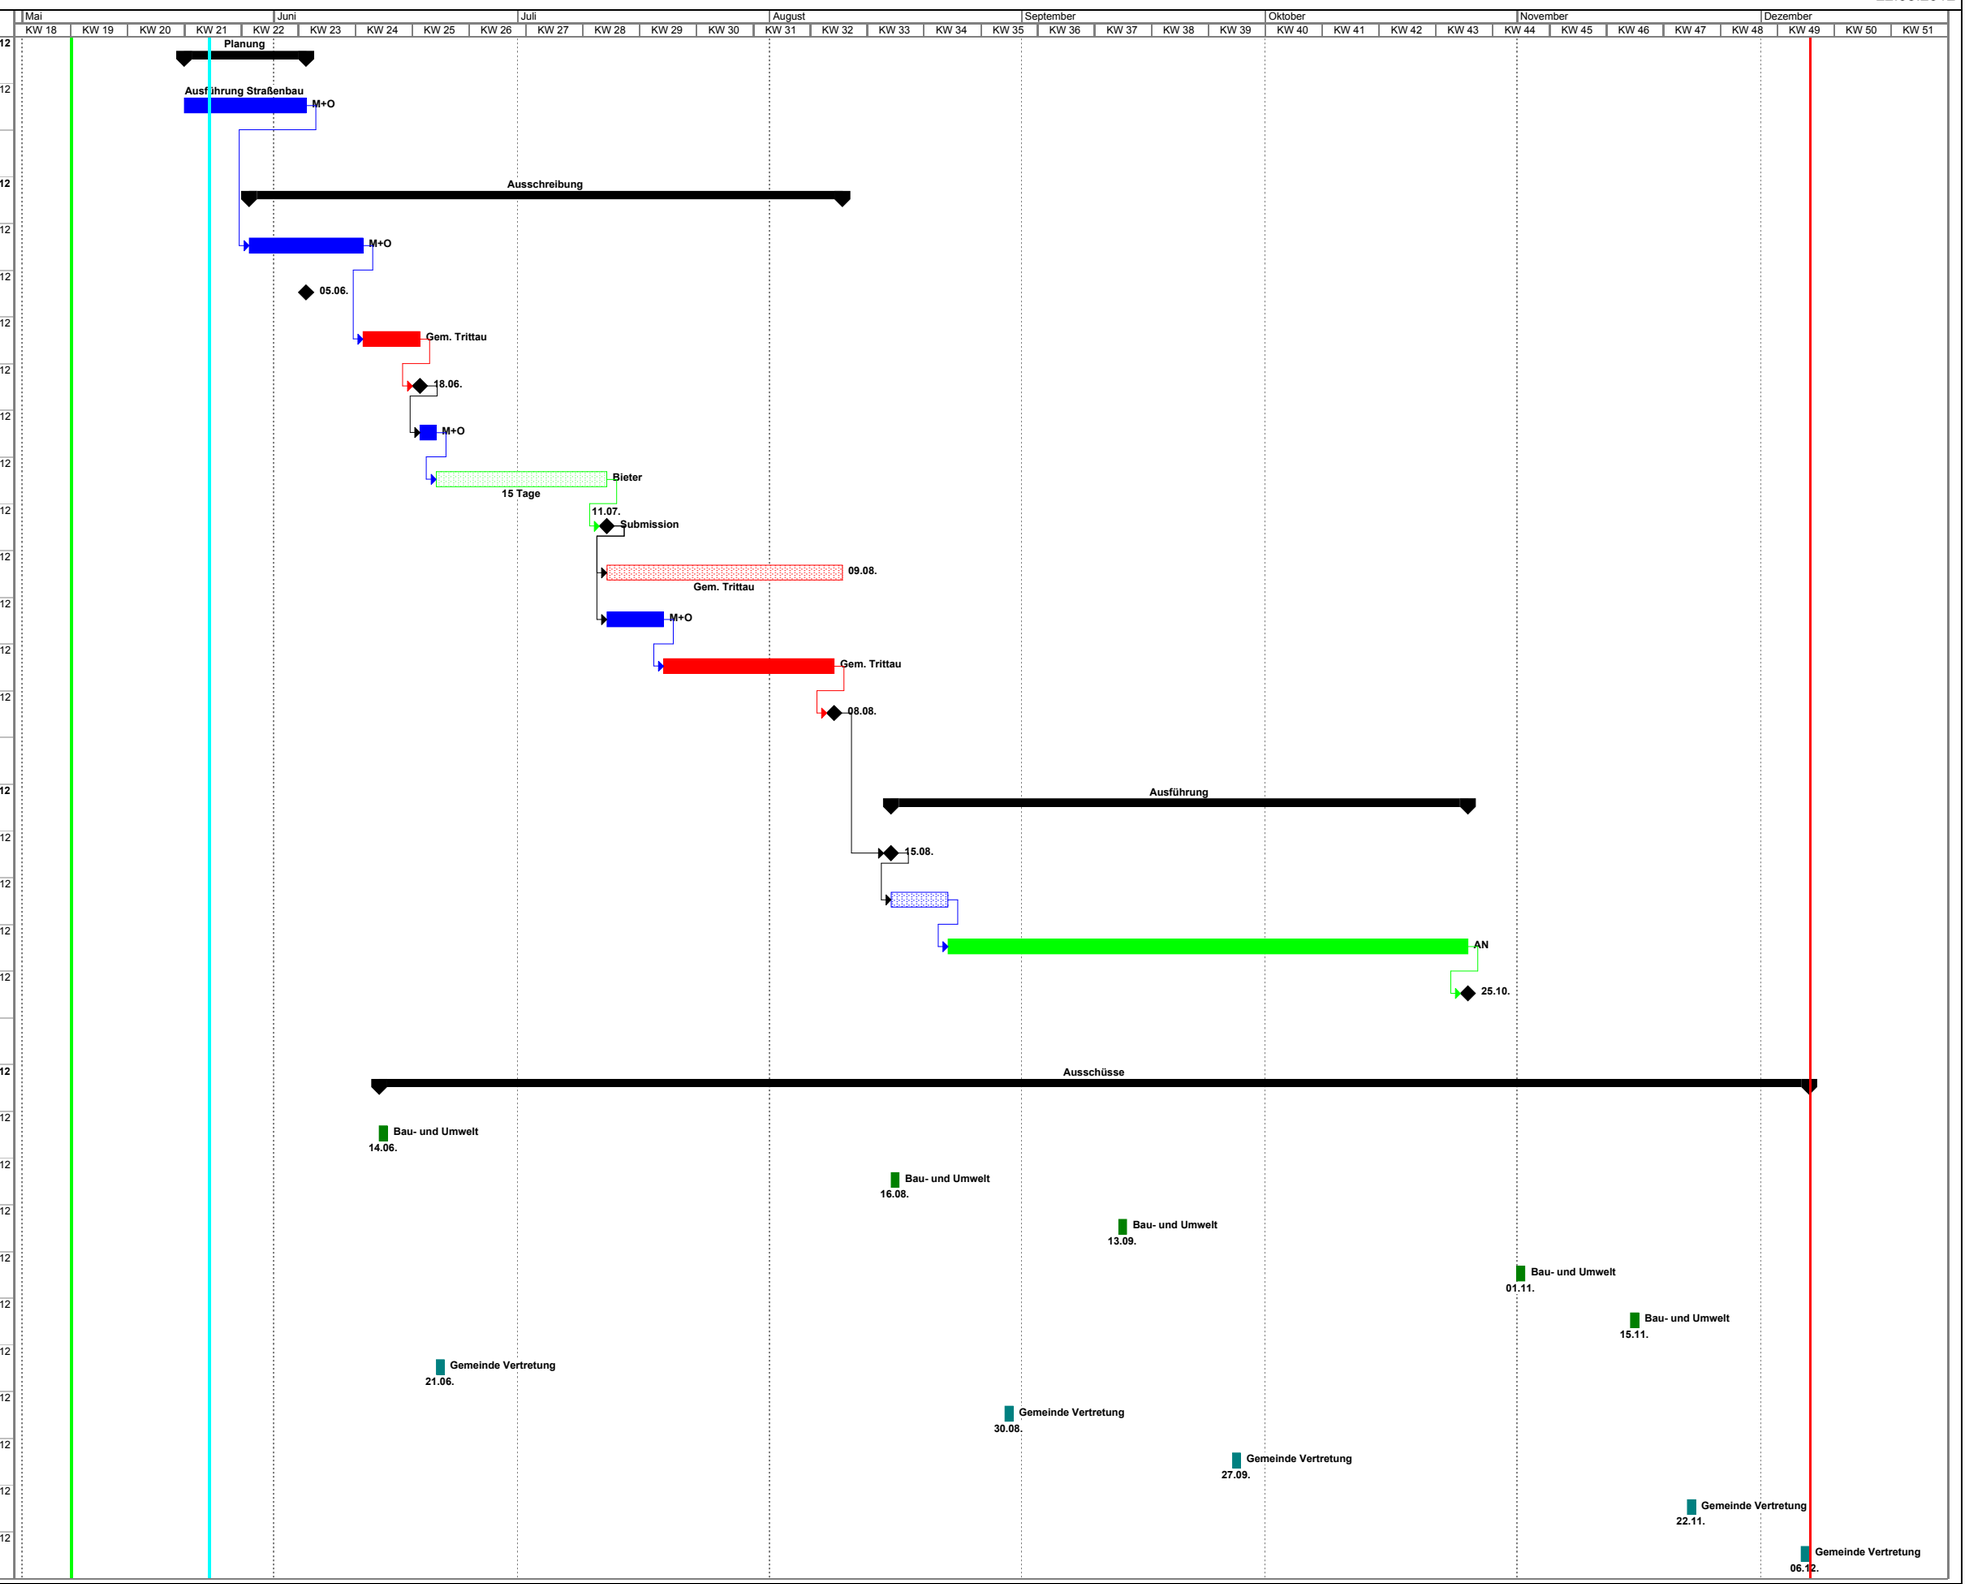

M+O Ingenieurgesellschaft mbH
Gewerbering 2
22113 Oststeinbek

Datei : Terminplan Ausschreibung und Ausführung.mpp
Druck: Do 24.05.12
